

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften

Vw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be


Verslagnummer: 0292-170118-04 Datum van het onderzoek: 18/01/2017
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE: KERREMANS (HUURDER)
VIJFKAMPSTRAAT 26 gvl links
2020 ANTWERPEN

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR: CHAULIAC
Adres: EMIEL GEBRUEERSSTRAAT 41
2140 BORGERHOUT

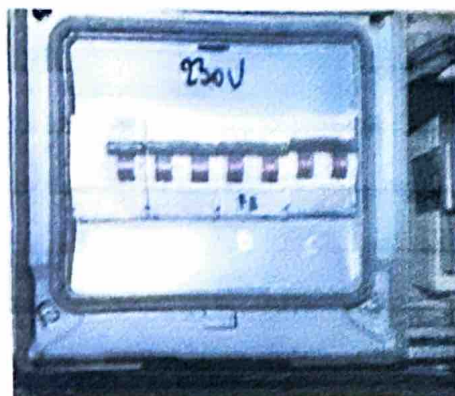

OPDRACHTGEVER: CHAULIAC
Adres: EMIEL GEBRUEERSSTRAAT 41
2140 BORGERHOUT

INSTALLATEUR:
Adres:

BTW of IK:

EAN: Teller nr. 34859851 Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie:	Type der Lokalen:	Appartement
Begin werken fundering: Voor 01/10/81	Elektrische installatie:	Voor 01/10/81
Aansluiting spanning: Mono 230V	AREI art.:	86
Voedingskabel hoofdbord: 2 x 6 mm ²	Bescherming van de aansluiting:	aut 32 A
Type van de aardelektrode: Pennen	Alg. schakelaar type:	2p40/30mA
Aantal borden: 2	Aantal eindstroombanen:	5
Uitwendige invloedsfactoren:	Schema:	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens: AREI art. 276bis,
Aard van het onderzoek: Controlebezoek

METINGEN:

RA: 4,6 Ohm Ri tot 10 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

BORD 1:

ADS 2P40A / 30:

2 X 2PC16:

1 X 2PC20:

BORD 2:

2 X 2PC20

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 Stopcontacten zonder aardpen zijn niet geschikt voor toestellen klasse 1.

Besluit

De installatie is conform.

De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.

De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/01/2042 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0292 MARC VERSCHUERE

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 27)

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
 - de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

Plichten van de EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 18/01/2042.


STAP 4


BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.



Beter Zicht
Beter Sijn

Schema's

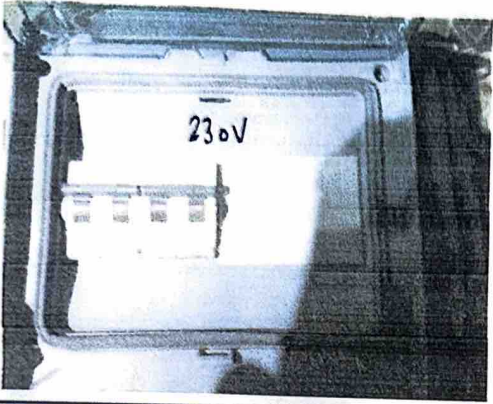

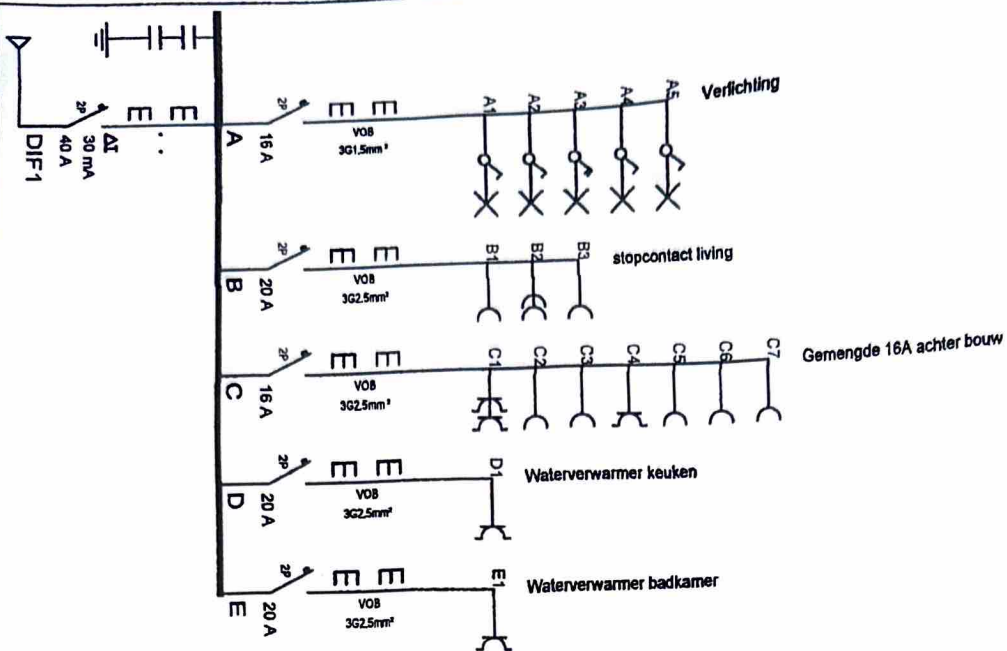

INSTALLATEUR

KEURING

WERF

Schema1A

3N, 400V/230V~


Naam IV-Techniek
BTW BE0537162841
Datum 05/01/2017
Handtek Wan (0497875826)

ORGANIS.
Naam
Datum
Handtek

Naam
Straat
Gemeente
Handtek

vijkampstraat
vijkampstraat
wijnijk

appartement

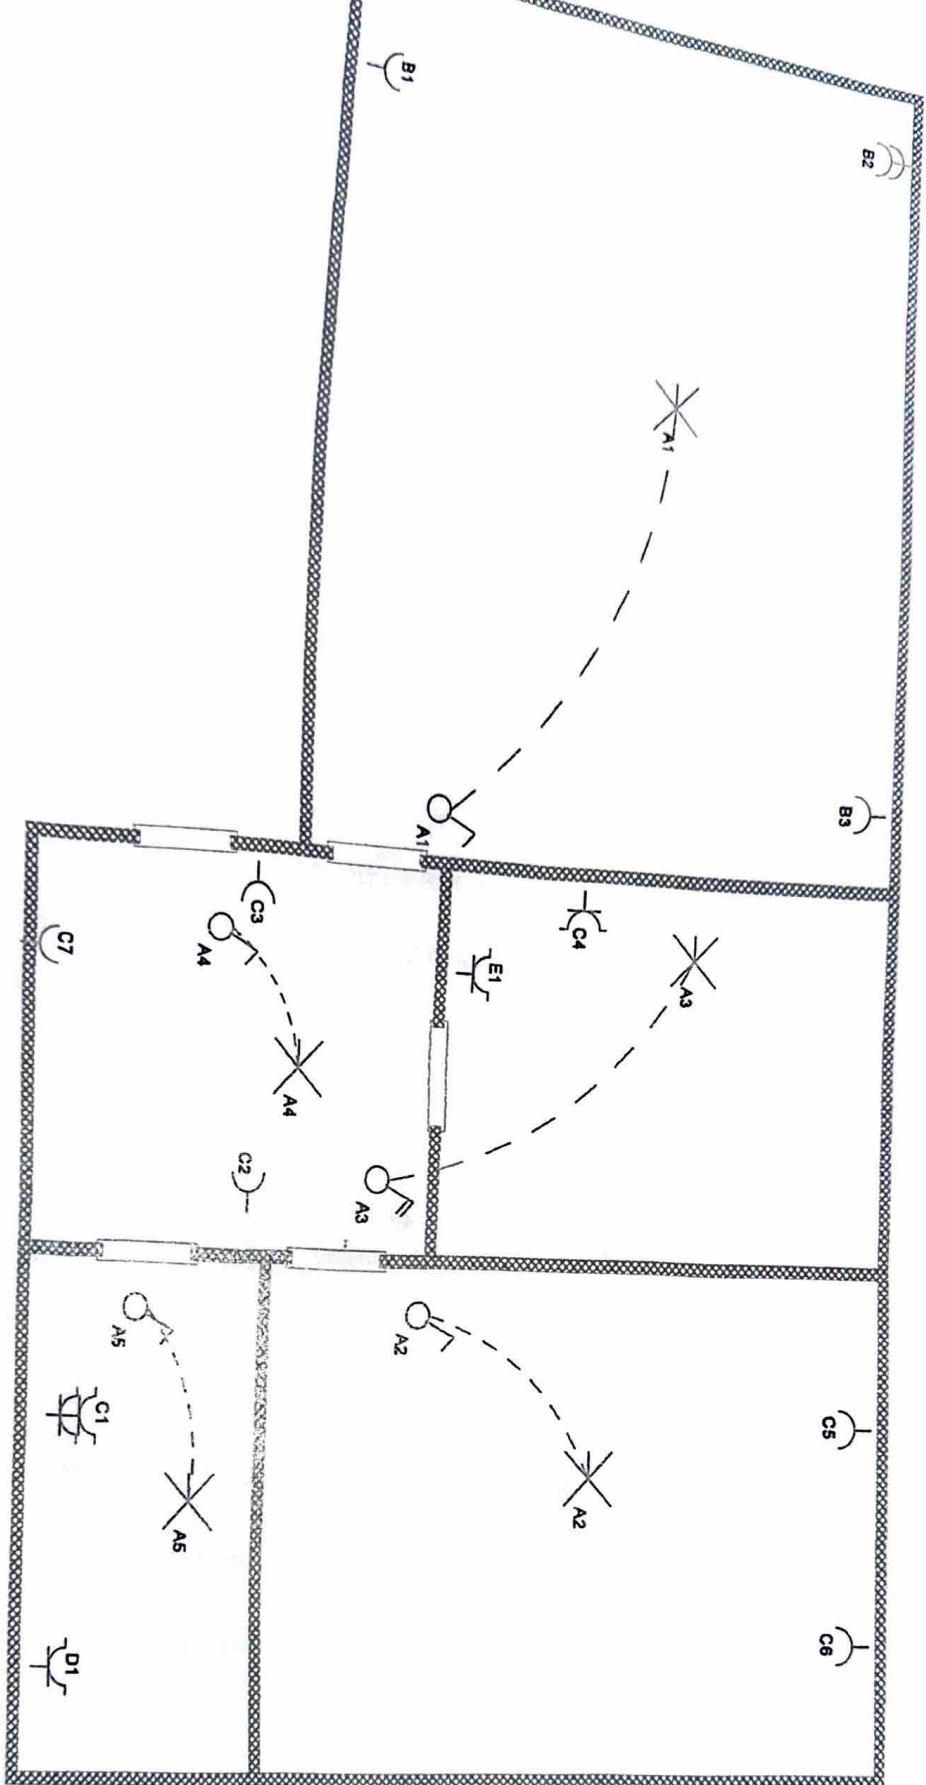

Bu
E921730718104
